Méthodologie Agile

Application de covoiturage

Travaux pratiques

1. Informations générales

Nom du projet	**CoRide** - Application de covoiturage
Contexte	Simulation de projet Agile/Scrum
Date de début	Mai 2026
Durée estimée	3 mois (plusieurs sprints de 2 semaines)
Équipe	Product Owner : Alimou DIALLO Scrum Master: Christopher SEM Chef de projet: Roger MBANZA Backend (API + BDD) : Yanne KUETI Frontend (UX + Design) : Christopher SEM, Roger MBANZA

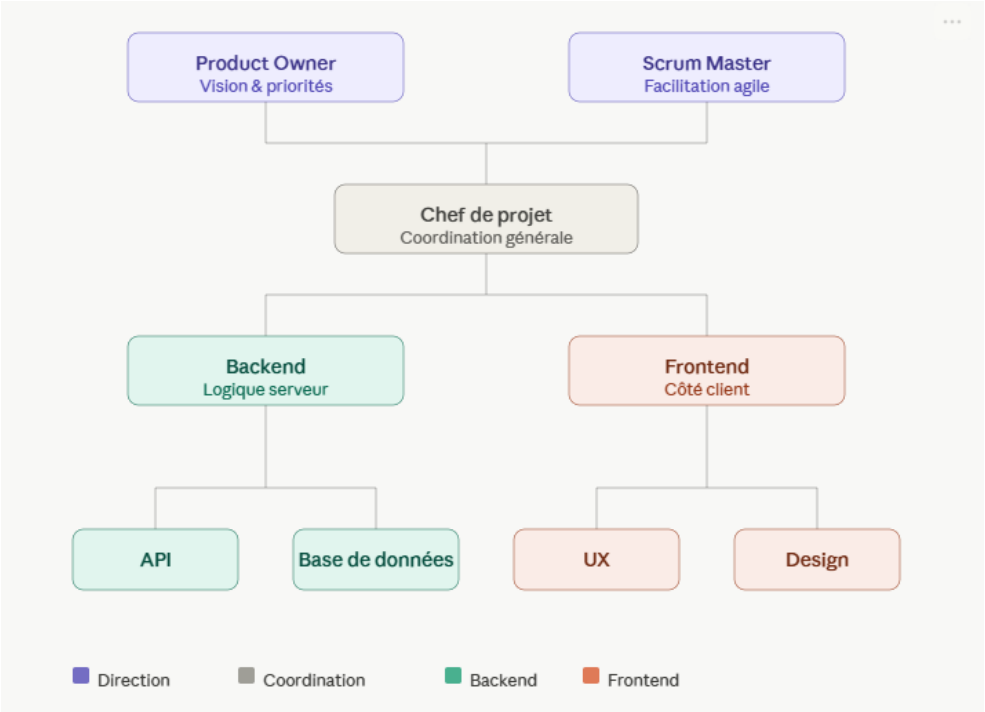

Formation de l'équipe

2. Vision produit

Problème identifié

Les étudiants et jeunes actifs font face à des coûts de transport élevés et des horaires de transports en commun inadaptés. De nombreux trajets domicile-école ou domicile-travail sont effectués avec un seul occupant par véhicule.

Notre solution

CoRide est une application web/mobile qui met en relation conducteurs et passagers pour des trajets réguliers ou ponctuels. L'objectif est de proposer une expérience simple, rapide et fiable.

Cible utilisateur

- Étudiants cherchant à réduire leurs frais de transport
- Jeunes actifs effectuant des trajets réguliers
- Conducteurs souhaitant partager les frais de carburant

Proposition de valeur

Trouver ou proposer un trajet en moins de 3 clics, avec un système de confiance basé sur les avis et la vérification des profils.

3. Périmètre fonctionnel

Fonctionnalités incluses (MVP)

- Inscription et connexion utilisateur
- Création et publication d'un trajet (conducteur)
- Recherche d'un trajet (passager)
- Réservation d'une place
- Système de notation et d'avis
- Messagerie simple entre utilisateur et conducteur

Fonctionnalités à ajouter plus tard dans le projet

- Paiement en ligne intégré
- Géolocalisation en temps réel
- Application iOS/Android native (web responsive uniquement)

4. User Stories

Les fonctionnalités sont exprimées sous forme de User Stories selon le format standard Scrum.

En tant que	Je veux	Afin de	Priorité
Passager	rechercher un trajet par ville et date	trouver rapidement un covoiturage disponible	Haute
Passager	réserver une place sur un trajet	confirmer ma participation au covoiturage	Haute
Conducteur	publier un trajet avec départ, arrivée et heure	proposer des places disponibles dans ma voiture	Haute
Conducteur	accepter ou refuser une réservation	gérer les passagers de mon trajet	Haute
Utilisateur	créer un compte et me connecter	accéder à l'application de manière sécurisée	Haute
Utilisateur	laisser un avis après un trajet	partager mon expérience et aider la communauté	Moyenne
Utilisateur	contacter le conducteur via messagerie	coordonner les détails du trajet	Moyenne
Utilisateur	consulter mon historique de trajets	retrouver mes trajets passés et futurs	Faible

5. Product Backlog priorisé

ID	Fonctionnalité	Priorité	Sprint
US-01	Inscription et connexion utilisateur	Haute	Sprint 1
US-02	Création d'un trajet (conducteur)	Haute	Sprint 1
US-03	Recherche de trajet (passager)	Haute	Sprint 1
US-04	Réservation d'une place	Haute	Sprint 1
US-05	Acceptation / refus de réservation	Haute	Sprint 2
US-06	Messagerie entre utilisateurs	Moyenne	Sprint 2
US-07	Système de notation et d'avis	Moyenne	Sprint 2
US-08	Historique des trajets	Faible	Sprint 3
US-09	Profil utilisateur complet	Faible	Sprint 3

6. Organisation Scrum

Rôles

Product Owner	Définit la vision produit, priorise le backlog, valide les fonctionnalités livrées
Scrum Master	Facilite les cérémonies Scrum, lève les obstacles, garantit le respect de la méthode
Chef de projet	Coordination générale, lien entre les équipes, suivi des délais
Équipe Backend	Développement de l'API REST et gestion de la base de données
Équipe Frontend	Développement de l'interface utilisateur, UX et design des écrans

Cérémonies Scrum

- Sprint Planning (début de sprint) : planification des tâches du sprint
- Daily Standup (chaque jour) : point rapide de 15 min — ce qui a été fait, ce qui sera fait, les blocages
- Sprint Review (fin de sprint) : démonstration des fonctionnalités livrées
- Rétrospective (fin de sprint) : analyse de ce qui a bien/mal fonctionné, axes d'amélioration

Durée des sprints

2 semaines par sprint. Objectif : 3 sprints pour couvrir le MVP complet.

7. Planning macro

Sprint 1	US-01 à US-04 — Authentification + création et recherche de trajet
Sprint 2	US-05 à US-07 — Réservation, messagerie, notation
Sprint 3	US-08 à US-09 — Historique, profil, finitions et tests
Livraison finale	Présentation du projet + démo fonctionnelle

CoRide — Board de suivi

Planning macro · 3 sprints · 7 semaines

Tous | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Livraison

A faire (4)

Sprint 1
Inscription & connexion utilisateur
US-01 · Sem. 1-2 — CP BE

Sprint 1
Création d'un trajet (conducteur)
US-02 · Sem. 1-2 — BE

Sprint 1
Recherche de trajet (passager)
US-03 · Sem. 1-2 — BE FE

Sprint 1
Réservation d'une place
US-04 · Sem. 1-2 — BE FE

+ Ajouter une carte

En cours (0)

+ Ajouter une carte

En révision (0)

+ Ajouter une carte

Terminé (0)

Sprint 1 · Sprint 2 · Sprint 3 · Livraison · Priorité haute · Priorité moyenne · Priorité faible

CoRide — Board de suivi

Planning macro · 3 sprints · 7 semaines

Tous | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Livraison

A faire (3)

Sprint 2
Acceptation / refus de réservation
US-05 · Sem. 3-4 SM BE

Sprint 2
Messagerie entre utilisateurs
US-06 · Sem. 3-4 SM FE

Sprint 2
Système de notation & avis
US-07 · Sem. 3-4 FE

+ Ajouter une carte

En cours (0)

+ Ajouter une carte

En révision (0)

+ Ajouter une carte

Terminé (0)

Sprint 1 · Sprint 2 · Sprint 3 · Livraison · Priorité haute · Priorité moyenne · Priorité faible

CoRide — Board de suivi

Planning macro · 3 sprints · 7 semaines

Tous | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Livraison

A faire (3)

Sprint 3
Historique des trajets
US-08 · Sem. 5-6 — PO BE

Sprint 3
Profil utilisateur complet
US-09 · Sem. 5-6 — PO FE

Sprint 3
Tests & corrections finales
Sem. 5-6 — CP BE FE

+ Ajouter une carte

En cours (0)

+ Ajouter une carte

En révision (0)

+ Ajouter une carte

Terminé (0)

Sprint 1 · Sprint 2 · Sprint 3 · Livraison · Priorité haute · Priorité moyenne · Priorité faible

CoRide — Board de suivi

Planning macro · 3 sprints · 7 semaines

Tous | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Livraison

A faire (3)

Livraison
Démo fonctionnelle
Sem. 7 — CP PO

Livraison
Documentation technique
Sem. 7 — CP

Livraison
Soutenance finale
Sem. 7 — CP PO SM

+ Ajouter une carte

En cours (0)

+ Ajouter une carte

En révision (0)

+ Ajouter une carte

Terminé (0)

Sprint 1 · Sprint 2 · Sprint 3 · Livraison · Priorité haute · Priorité moyenne · Priorité faible

8. Sprint Review & Retrospective

La Sprint Review c'est la démonstration de ce qui a été livré. La Rétrospective c'est le regard interne de l'équipe sur comment on a travaillé. Ce sont deux cérémonies distinctes mais qui se font à la fin de chaque sprint.

Sprint Review — Démonstration & retours

Semaines 1-2 · Sprint 1 · Animé par le Scrum Master

Démonstration produit

Présentation en live des fonctionnalités livrées : inscription, connexion, création et recherche de trajet, réservation d'une place.

Participants

Product Owner, Scrum Master, Chef de projet, équipes Backend & Frontend. Idéalement : 1-2 utilisateurs testeurs extérieurs.

Critères de validation

Chaque User Story est soit ✓ Acceptée, soit ✗ Rejetée par le Product Owner selon la Definition of Done.

FONCTIONNALITÉS DÉMONTRÉES

- US-01 Inscription ✓
- US-02 Création trajet ✓
- US-03 Recherche ✓
- US-04 Réservation ⚠

RETOURS UTILISATEURS RECUEILLIS

- Formulaire d'inscription trop long
- Filtres de recherche insuffisants
- Bug : double réservation possible

Rétrospective — Analyse interne de l'équipe

Format : Start / Stop / Continue · Durée : 45 min

Ce qui a bien marché

- Communication fluide entre Backend et Frontend
- Daily Standup respecté chaque jour
- API documentée dès le début du sprint

Ce qui n'a pas marché

- US-04 sous-estimée, pas terminée à temps
- Pas de tests avant la démo
- Réunions de sprint planning trop longues

Actions pour le prochain sprint

- Ajouter des tests avant chaque démo
- Limiter le sprint planning à 1h max
- Revoir l'estimation de US-04

9. Iteration

Cycle d'itération Scrum

Sprint 1 terminé → Lancement Sprint 2

1 Sprint Review › 2 Rétrospective › 3 MAJ Backlog › 4 Priorisation › 5 Sprint Planning › 6 Sprint 2 — GO

3 / 4	1	4
US livrées Sprint 1	US reportée (US-04)	Nouvelles US Sprint 2

Backlog mis à jour — Sprint 2

Après priorisation par le Product Owner · Sem. 3-4

Reportées du Sprint 1

US-04	Réservation d'une place	Reporté
BUG-01	Correction double réservation	Haute
UX-01	Simplifier formulaire inscription	Moyenne

Nouvelles US planifiées

US-05	Acceptation / refus de réservation	Haute
US-06	Messagerie entre utilisateurs	Moyenne
US-07	Système de notation & avis	Moyenne
US-10	Amélioration filtres de recherche	Nouveau

Sprint 2 — Lancement

Sem. 3-4 · Responsable : Scrum Master + Frontend

Sprint Planning

Durée : 1h max (amélioration retro)
Objectif : valider les US du sprint
Estimer en points chaque tâche
Répartir les responsabilités

Objectif du sprint

Finaliser la réservation (US-04)
Ouvrir la communication (US-06)
Ajouter la notation (US-07)
Corriger les bugs du Sprint 1

Definition of Done

Code revu par un pair
Tests fonctionnels passés
Validé par le Product Owner
Documenté dans le backlog

CoRide — Sprint 2

Sem. 3-4 · Scrum Master + Frontend · 14 jours

🔄 Sprint en cours — Jour 8/14

10	3	3	2	2
Tâches total	À faire	En cours	En révision	Terminées

Progression Sprint 2 — 2 / 10 terminées

À faire (3)

- Feature — Système de notation & avis — US-07 — FE
- UX — Amélioration filtres de recherche — US-10 — FE BE
- Test — Tests end-to-end réservation — TST-01 — SM

En cours (3)

- Feature — Réservation d'une place (reporté S1) — US-04 — BE FE
- Feature — Messagerie entre utilisateurs — US-06 — FE
- UX — Simplification formulaire inscription — UX-01 — FE

Bloqué (1)

- Bug — Correction double réservation — ⚠ En attente de réponse API — BUG-01 — BE

En révision (2)

- Feature — Acceptation / refus de réservation — US-05 — SM PO
- Bug — Fix : session expirée trop tôt — BUG-02 — BE

Terminé (2)

- UX — Refonte page de connexion (retour S1) — US-01b — FE
- Feature — Validation création trajet (retour S1) — US-02b — BE
